

林道西山線開設事業 概要説明書

林道名	にしやせん 西山線		
起点	津幡町字牛首	終点	津幡町字瓜生
補助事業名	林道開設事業(道整備交付金)(国 50% 県 20% 町 25% 地元 5%)		
林道区分	森林管理道	設計速度	20km/h
事業期間	平成13年度～平成28年度(予定)		
延長	L=4,180m		
幅員	W=4.0~3.5m(車道 3m)		
森林整備区域	120ha		
整備目的	森林整備をよりいっそう進めるため、林道を整備し生産体制の強化に伴う低コスト施業の実現及び、地域の生活道路、森林レクリエーション等への活用を目的としている。		


事業進捗状況	平成13年度～平成23年度まで		
1工区	全体延長	L=2,235m	開設済 L=1,635m(内舗装 L=1,320m)
2工区	全体延長	L=1,945m	開設済 L=1,580m(内舗装 L=1,380m)
合計	全体延長	L=4,180m	開設済 L=3,215m(内舗装 L=2,700m)
平成24年度	開設延長	L= 200m	(舗装 L= 0m)
残事業	開設延長	L= 765m	(舗装 L=1,480m)

全体事業費 710,000,000 円 1m当たり価格 約170,000円/m(開設約150,000円、舗装約20,000円)

位置図



標準断面図

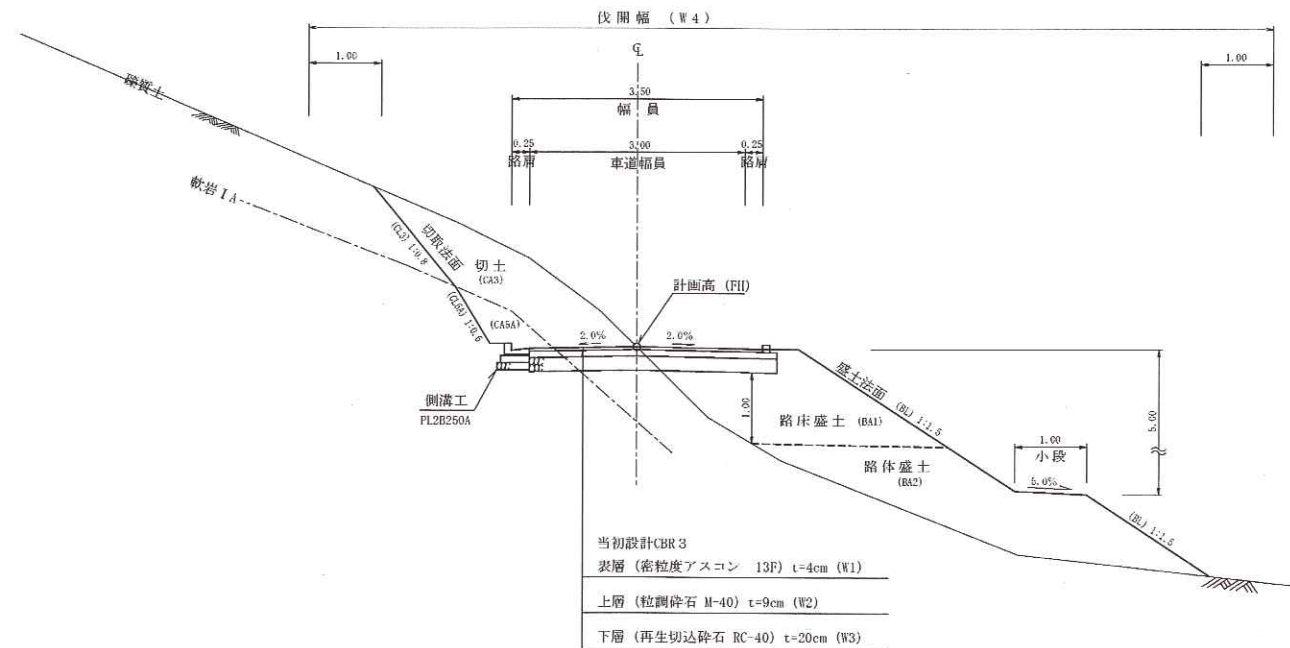

事業名	工区 年度	1工区		2工区		全体		事業費 円
		開設 m	舗装 m	開設 m	舗装 m	開設 m	舗装 m	
林業地域 総合整備事業	H13	587				587	0	70,000,000
	H14		580	489		489	580	70,000,000
	H15	246		480		246	480	59,091,000
	H16			501		501	0	40,000,000
小計		833	580	990	480	1,823	1,060	239,091,000
林道開設事業 (道整備交付金1期目)	H17	127		480		127	480	38,548,000
	H18	235				235	0	50,000,000
	H19			410		410	0	45,000,000
	H20	150				150	0	28,000,000
H21	80	740		420	80	1,160	40,000,000	
小計		592	740	410	900	1,002	1,640	201,548,000
林道開設事業 (道整備交付金2期目)	H22			180		180	0	40,001,000
	H23	210				210	0	40,000,000
小計		210	0	180	0	390	0	80,001,000
累計		1,635	1,320	1,580	1,380	3,215	2,700	520,640,000
林道開設事業(道整備交付金2期目)	H24	200				200	0	40,000,000
小計		200	0	0	0	200	0	40,000,000
林道開設事業 (道整備交付金2期目)	H25	300				300	0	50,000,000
	H26		805	190		995	0	19,360,000
小計		300	805	0	190	300	995	69,360,000
林道開設事業 (道整備交付金3期目)	H27			365		365	0	50,000,000
	H28	100	110	375		485	110	30,000,000
小計		100	110	365	375	465	485	80,000,000
合計		2,235	2,235	1,945	1,945	4,180	4,180	710,000,000
