


町道川尻17号線道路改良事業

概要説明書

議案第1号

町道名 町道川尻17号線  
 起 点 津幡町字川尻 終 点 津幡町字舟橋  
 補助事業名 社会資本整備総合交付金 活力創出基盤整備 (補助率0.55)  
 道路の区分 地方部の市町村道 交通量 3,000台/12h  
 事業期間 平成19年度~平成26年度  
 延長 L=940m  
 幅員 W=10.5m (内歩道2.5m)  
 設計速度 50km/h  
 整備目的 本路線の幅員の拡幅や歩道の整備を行うことにより、多くの交通量の円滑化及び歩行者の安全確保を図る。さらに都市計画マスタープランにおいて複合機能開発ゾーンへのアクセス道路として整備し、流通機能と商業機能等の集積立地の推進を図る。  
 事業進捗状況 平成23年度末まで  
 全体 延長 L=940m 整備済 L=640m  
 残事業 延長 L=300m  
 全体事業費 351,000,000円 進捗率(事業費) 265,420,000円/351,000,000円≒75.6%

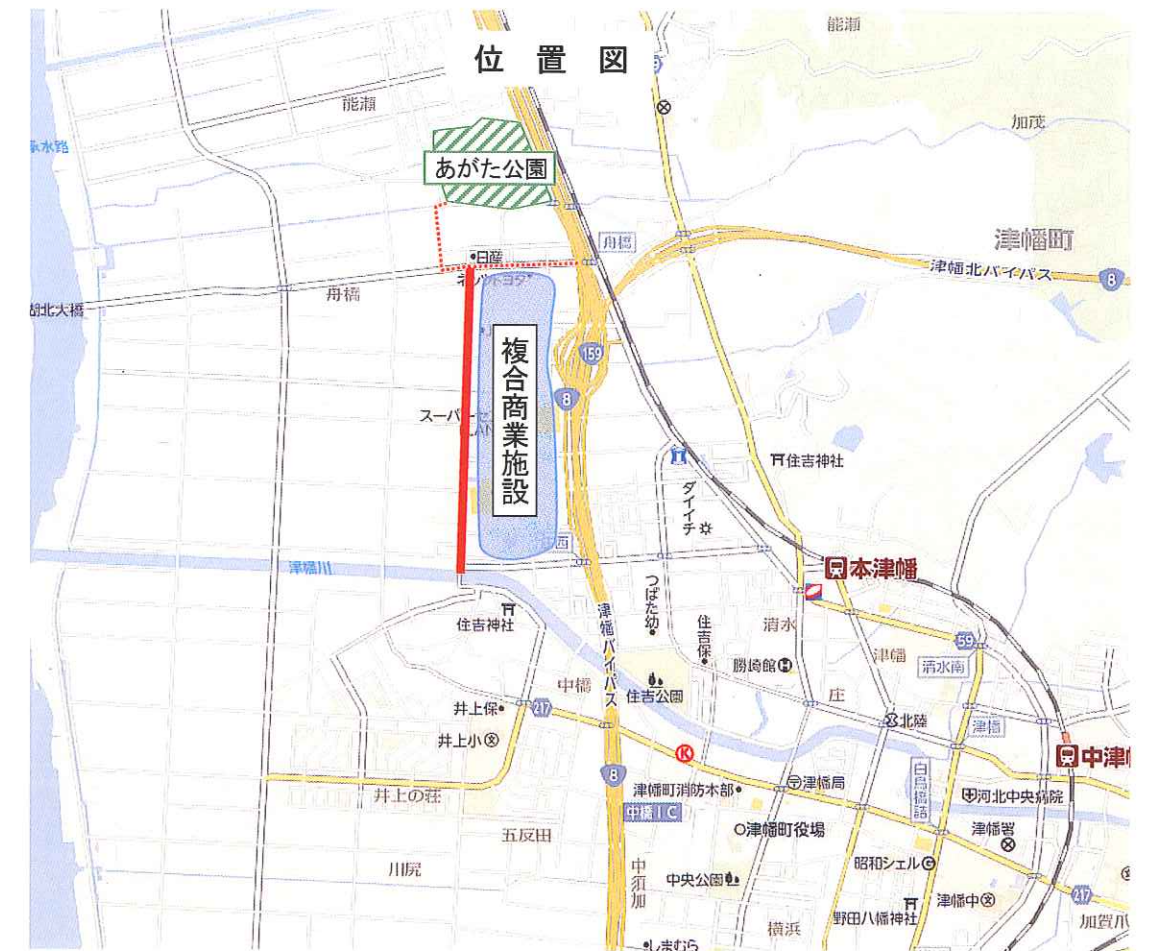

事業名	年度	整備延長	事業費 (円)
地方道路整備 臨時交付金	H19	10m (取付道路120m)	40,000,000
〃	H20	165m	50,000,000
地域活力基盤 創造交付金	H21	170m	52,600,000
社会資本整備 総合交付金	H22	160m	69,200,000
〃	H23	135m	53,620,000
	小計	640m	265,420,000
社会資本整備 総合交付金	H24	130m	40,320,000
	H25以降	170m	45,260,000
	合計	940m	351,000,000

